ผลการดำเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	หมายเหตุ
		ขั้นต้น (50 คะแนน)	ขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน)	ขั้นสูง (100 คะแนน)				
การประเมินประสิทธิผลในการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ 70							54.01	
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	5	ร้อยละ 8.52	ร้อยละ 9.51	ร้อยละ 10.50	ร้อยละ 12.12	100.00	5.00	Strategic KPIs วัดทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	5	ร้อยละ 4.89	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5.11	ร้อยละ 6.18	100.00	5.00	
3) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เป็นสินค้าอินทรีย์	5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 7.42	ร้อยละ 9.84	ร้อยละ 11.76	100.00	5.00	
4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น (บาท/ครัวเรือน/ปี)	5	80,069.67	82,987.00	83,649.00	83,130.00 (บาท/ครัวเรือน/ปี)	80.40	4.02	
5) จำนวนการขยายพื้นที่ชลประทาน (ล้านไร่)	10	35.65 ล้านไร่	35.66 ล้านไร่	35.67 ล้านไร่	35.716 ล้านไร่	100.00	10.00	Strategic KPIs และ Function KPIs
6) ร้อยละของจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำชลประทานที่ได้มาตรฐาน	10	ร้อยละ 98	ร้อยละ 99	ร้อยละ 100	ร้อยละ 99.64	91.00	9.10	Joint KPIs
7) ร้อยละของปริมาตรเก็บกักน้ำ	10	ร้อยละ 69.76 (74.922 ล้าน ลบ.ม.)	ร้อยละ 76.26 (81.903 ล้าน ลบ.ม.)	ร้อยละ 79.73 (85.630 ล้าน ลบ.ม.)	ร้อยละ 77.50 (83.23 ล้าน ลบ.ม.)	83.93	8.39	
8) ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานได้รับน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี	10	+/- 4.20	+/- 1.91	+/- 0.75	ร้อยละ +1.91	75.00	7.50	
9) ร้อยละของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	10	ร้อยละ 75.45 (329,444 ไร่)	ร้อยละ 80.92 (353,328 ไร่)	ร้อยละ 86.39 (377,212 ไร่)	ร้อยละ 67.82 (296,113 ไร่)	0.00	0.00	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักร้อยละ 30							26.00	
10) คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	10	300 คะแนน	400 คะแนน	470 คะแนน	390.62 คะแนน	72.66	7.27	ผลจาก สนง.กพร.
11) ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	5	Pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 6 pillar	Pillar ระดับ 3 ขึ้นไป 7 pillar	Pillar ระดับ 4 ขึ้นไป 3 pillar และไม่มี pillar ที่ต่ำกว่าระดับ 3	Pillar ระดับ 4 ขึ้นไป 4 pillar และไม่มี pillar ที่ต่ำกว่าระดับ 3	100.00	5.00	ผลจาก DGA
12) คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย	5	60.73 คะแนน	70.73 คะแนน	70.74 คะแนน	77.71 คะแนน	100.00	5.00	
13) คะแนน EIT Public	5	76.31 คะแนน	81.31 คะแนน	86.31 คะแนน	87.33 คะแนน	100.00	5.00	ผลจาก ปปท.
14) คะแนน EIT Survey	5	81.72 คะแนน	86.72 คะแนน	91.72 คะแนน	86.67 คะแนน	74.75	3.74	
					คะแนนรวม		80.02	ระดับดี

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการ ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1) ระดับดีมาก มีค่าคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 90.00 – 100 คะแนน
2) ระดับดี มีค่าคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 60.00 – 89.99 คะแนน
3) ระดับพอใช้ มีค่าคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่าง ต่ำกว่า 60.00 คะแนน

ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมชลประทานได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ำ

1. ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2568

ตัวชี้วัด ชป.-01 จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ	จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำ ณ ต้นปีงบประมาณ (ล้านลูกบาศก์เมตร)	จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)	จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำ ณ สิ้นปีงบประมาณ (ล้านลูกบาศก์เมตร)
2561	77,995.14	116.14	78,111.28
2562	78,111.28	1.21	78,112.49
2563	78,112.49	146.80	78,259.29
2564	78,259.29	30.33	78,289.62
2565	78,289.62	93.14	78,382.76
2566	78,382.76	80.70	78,463.46
2567	78,463.46	52.26	78,515.72
2568	78,515.72	72.22	78,587.94

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด ชป.-01 จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ.)

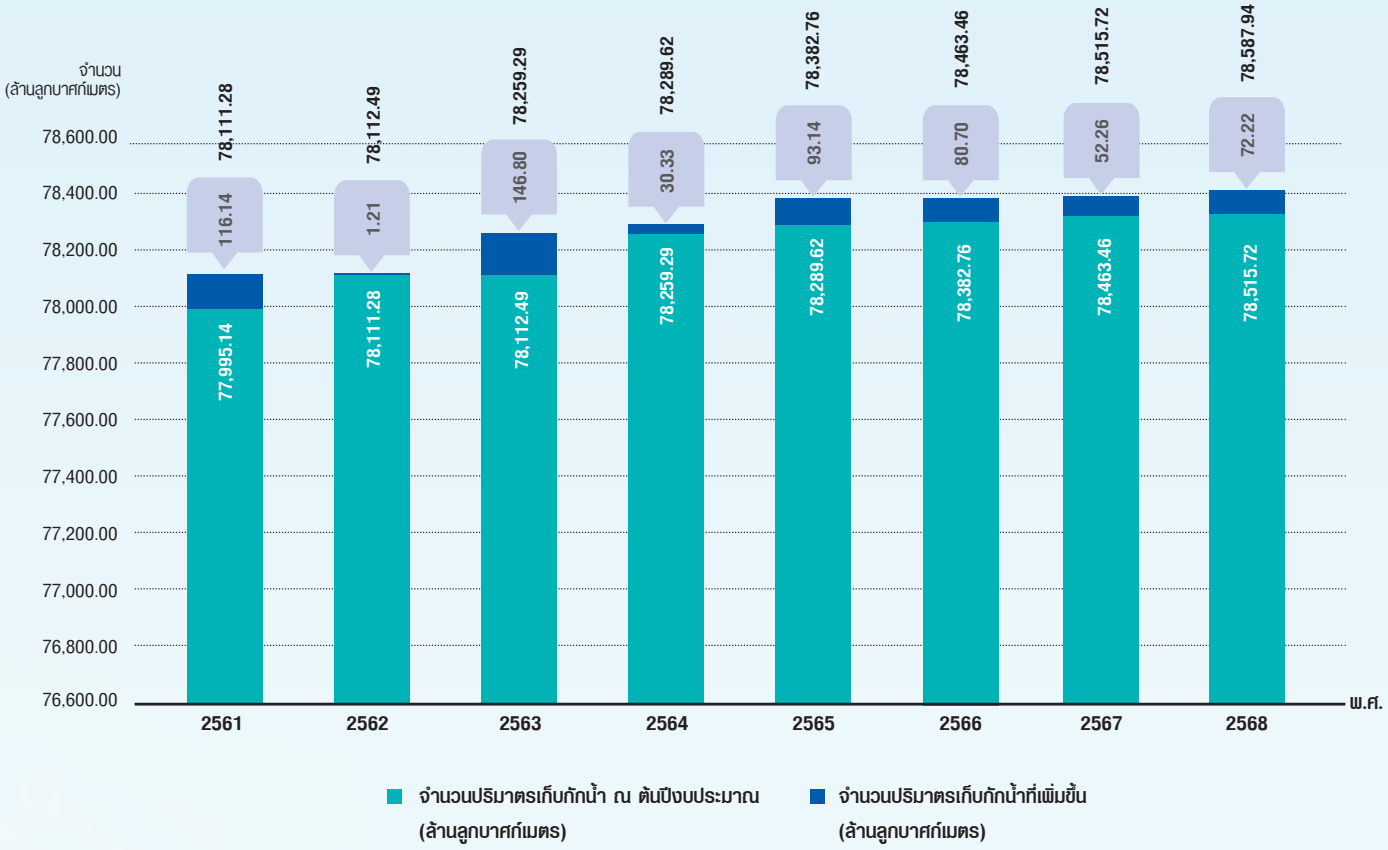

ตัวชี้วัด ชป.-01 จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ผลการดำเนินงานรวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

ปีงบประมาณ	จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำ ณ ต้นปีงบประมาณ (ล้านลูกบาศก์เมตร)	จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)	จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำ ณ สิ้นปีงบประมาณ (ล้านลูกบาศก์เมตร)
2561	78,002.44	119.98	78,122.42
2562	78,122.42	45.82	78,168.24
2563	78,168.24	160.46	78,328.70
2564	78,328.70	62.27	78,390.97
2565	78,390.97	111.70	78,502.67
2566	78,502.67	95.36	78,598.03
2567	78,598.03	52.71	78,650.74
2568	78,650.74	83.23	78,733.97

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด ชป.-01 จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)
ผลการดำเนินงานรวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

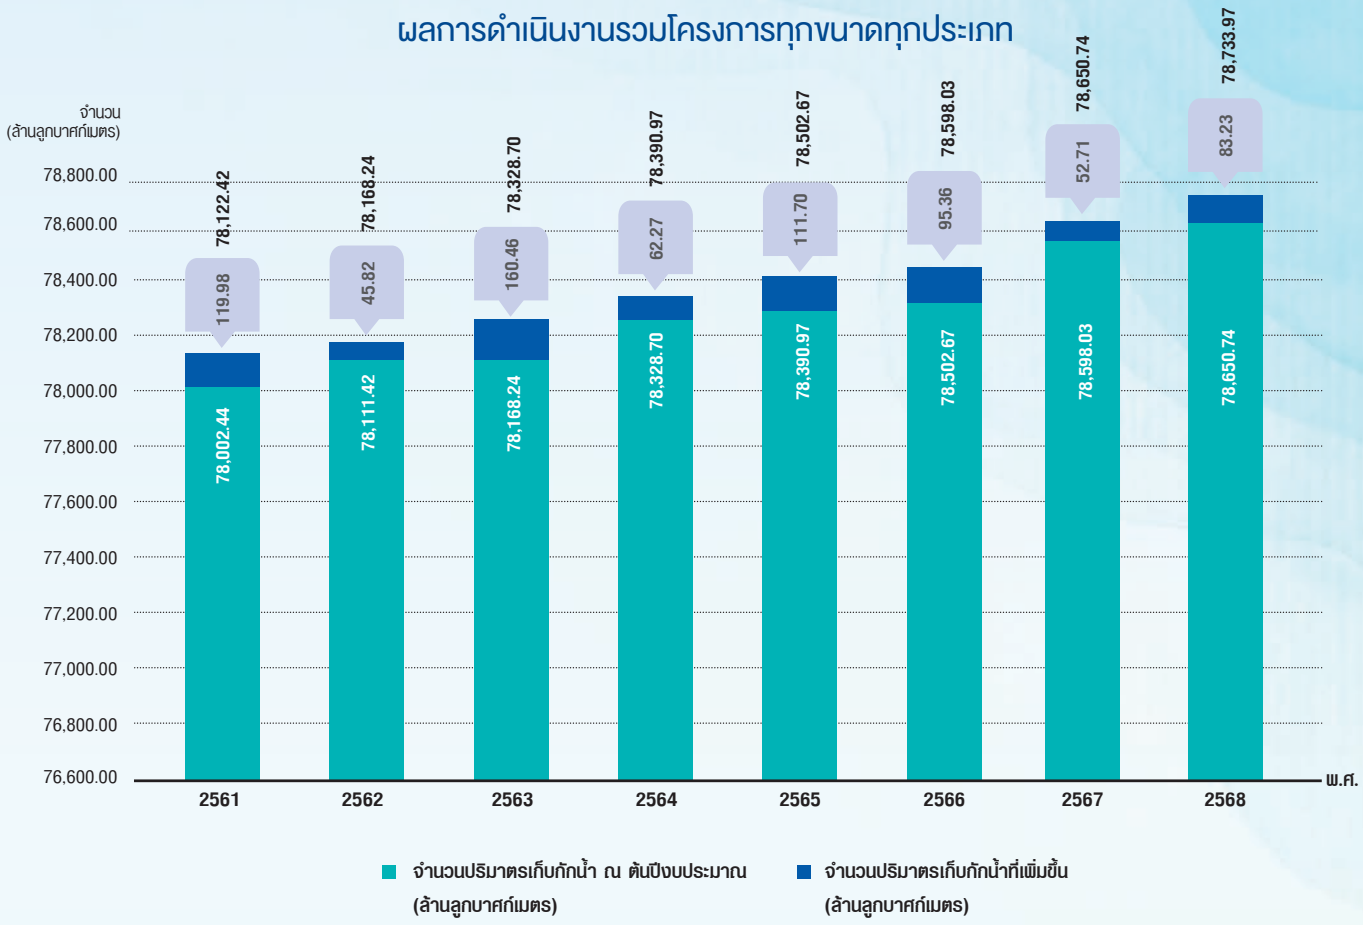

ตัวชี้วัด ชป.-02 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ.)

ปีงบประมาณ	จำนวนพื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)	จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	จำนวนพื้นที่ชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ (ไร่)
2561	24,778,520	103,531	24,882,051
2562	24,882,051	76,875	24,958,926
2563	24,958,926	15,831	24,974,757
2564	24,974,757	40,939	25,015,696
2565	25,015,696	35,563	25,051,259
2566	25,051,259	82,258	25,133,517
2567	25,133,517	23,840	25,157,357
2568	25,157,357	108,179	25,265,536

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

ตัวชี้วัด ชป.-02 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ผลการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี (พ.ร.บ.)

ตัวชี้วัด ชป.-02 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
ผลการดำเนินงานรวมโครงการทุกขนาดทุกประเภท

ปีงบประมาณ	จำนวนพื้นที่ชลประทาน ณ ต้นปีงบประมาณ (ไร่)	จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	จำนวนพื้นที่ชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ (ไร่)
2561	30,925,901	274,824	31,200,725
2562	31,200,725	238,897	31,439,622
2563	31,439,622	71,792	31,511,414
2564	31,511,414	149,222	31,660,636
2565	31,660,636	120,688	31,781,324
2566	31,781,324	165,155	31,946,479
2567	31,946,479	54,190	32,000,669
2568	32,000,669	175,325	32,175,994

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ำ จำนวน 15 โครงการ ดังนี้

2.1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
2.2 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา
2.3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์
2.4 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
2.5 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
2.6 โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร
2.7 โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2.8 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
2.9 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง
2.10 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี
2.11 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี
2.12 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน
2.13 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
2.14 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.15 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

2. แผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ที่สนับสนุนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลุ่มน้ำ

2.1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์	เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตอบสนองความต้องการใช้น้ำทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภค - บริโภค ภาคอุตสาหกรรมและเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง - แม่งัด - แม่กวง ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เป้าหมาย	ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 279,298 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ	16 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2570)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 26 เมษายน 2554 (มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,000.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	548.00 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 467.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.23 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 81.36

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	100.00	81.36
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญา 1	15.56	74.24
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด – แม่กวง สัญญา 2	12.54	100.00
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญา 1	19.03	100.00
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญา 2	14.23	51.05 (ยกเลิกสัญญา)
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	38.64	68.26

2.2 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์	เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 28,000 ไร่ ฤดูแล้งสามารถส่งน้ำผ่านลำน้ำปี้ลงสู่แม่น้ำยม ให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จังหวัดแพร่ 35,000 ไร่ เพื่อการเกษตร อุปโภค - บริโภค ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง และตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำท่วมด้านท้ายน้ำในฤดูฝนบริเวณ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ลุ่มน้ำยมรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และผลิตกระแสไฟฟ้า
เป้าหมาย	มีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำเพื่อการชลประทานในเขตอำเภอเชียงม่วนในฤดูฝนได้ 28,000 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ระยะเวลาดำเนินการ	12 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2570)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,000.00 ล้านบาท (ขยายกรอบวงเงินจาก 3,981.00 ล้านบาท)
งบประมาณตามแผนปี 2568	587.79 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 585.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.55 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 45.39

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	100.00	45.39
ค่าที่ดิน	5.18	87.26
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	5.95	63.54
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	0.13	56.47
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	51.86	55.62
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	1.74	59.14
ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	27.04	16.56
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3.42	73.74
งบประมาณตามแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	4.68	100.00

2.3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์	เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภค ของราษฎรในพื้นที่อพยพ ที่อพยพออกมาจากบริเวณพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
เป้าหมาย	ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 53,500 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	บ้านกิ่วเคียน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะเวลาดำเนินการ	15 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2568)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 20 เมษายน 2554
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,800.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	95.12 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 95.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 100.00

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	100.00	100.00
ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 3	14.07	100.00
ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 4	8.69	100.00
ระบบท่อส่งน้ำสายซอยและอาคารประกอบ	8.20	100.00
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3.08	100.00
ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 และ 2	37.19	100.00
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	28.77	100.00

2.4 โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์	เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน 304,000 ไร่ และส่งน้ำสนับสนุนและปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำจากเดิม โดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ 42,600 ไร่
เป้าหมาย	พัฒนาระบบชลประทาน 481,400 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ระยะเวลาดำเนินการ	19 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2571)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,000.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	582.80 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 413.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.94 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 47.47

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน
โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	100.00	47.47
ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	12.73	68.33
ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2)	5.83	84.54
ระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งขวา	12.65	10.08
ระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งซ้าย	22.58	
ค่าที่ดิน	16.50	41.51
ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8.36	52.19
งานก่อสร้างแหล่งน้ำที่แล้วเสร็จ	21.35	100.00

2.5 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

วัตถุประสงค์	เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร การอุปโภค - บริโภค การบรรเทาอุทกภัย ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อขยายพื้นที่ชลประทานพื้นที่ใกล้เคียง
เป้าหมาย	ส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม 15,000 ไร่ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 300,195 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	บ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ระยะเวลาดำเนินการ	10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2570)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 24 เมษายน 2561 (อยู่ระหว่างเสนอ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลา)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,000.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	653.27 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 407.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.30 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 23.60

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	100.00	23.60
สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	9.23	82.24
สถานีสูบน้ำบ้านผึ่ง (สุวอ 2) พร้อมระบบส่งน้ำ	3.08	
พนังกั้นน้ำ	1.89	
ประตูระบายน้ำห้วยปากโพง	0.58	100.00
ประตูระบายน้ำหนองผักไหมล่าง	0.42	100.00
ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา	1.70	52.71
ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย	2.12	95.74
ประตูระบายน้ำดงสะพัง พื้นที่รับประโยชน์ 61,518 ไร่	1.69	81.83
ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง	4.26	48.23
ประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำบ้านดอนกลอย	3.83	16.41
ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	52.03	1.66
ระบบควบคุมอุทกภัยแบบอัจฉริยะ (Smart Flood Control System)	0.97	
ค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	8.12	34.84
ค่าที่ดิน ค่าครุภัณฑ์ ค่าสำรวจออกแบบ เผื่อเหลือเผื่อขาด	10.08	52.59

2.6 โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์	เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร การอุปโภค - บริโภค การบรรเทาอุทกภัย
เป้าหมาย	เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 10,000 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	บ้านก่อ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำเนินการ	9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2570)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 8 มกราคม 2562 (มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,249.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	101.92 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 98.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.09 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 53.02

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน
โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	100.00	53.02
ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ	31.30	100.00
ระบบชลประทานฝั่งขวา	28.02	55.94
ระบบชลประทานฝั่งซ้าย	28.02	
คันกั้นน้ำพร้อมขุดลอก	2.51	100.00
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	0.04	
เตรียมงานเบื้องต้นและก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	2.22	78.04
EIMP ค่าที่ดิน สำรวจออกแบบ	7.89	84.44

2.7 โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัตถุประสงค์	เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร การอุปโภค - บริโภค การบรรเทาอุทกภัย
เป้าหมาย	เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 72,500 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคกมาด ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ระยะเวลาดำเนินการ	10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2570)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 10 ตุลาคม 2560 (มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,000.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	455.28 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 451.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.07 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 47.35

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	100.00	47.35
ประตูระบายน้ำขนาดบานระบาย 15.00 X 13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	32.48	100.00
คันกั้นน้ำและอาคารประกอบ	2.04	61.11
สถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ PR1 ระยะที่ 1	8.76	41.39
ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ PR1 ระยะที่ 2	19.33	
สถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ PL บ้านกลาง	14.17	
สถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ PL1	2.74	
สถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ PL2 บ้านแก่งมี้	2.79	
สถานีสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ PL3 บ้านใหม่ศาลาเฟือง	2.92	
ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ PR	1.26	100.00
สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ PR	1.28	100.00
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เตรียมงานเบื้องต้น	1.15	96.80
ค่าส่วนประกอบอื่น	2.47	23.29
ค่าสำรวจออกแบบ	0.50	83.99
ค่าที่ดิน EIMP ค่าปิดงาน และเผื่อเหลือเผื่อขาด	8.11	34.97

2.8 โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่ บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
เป้าหมาย	ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ 75,000 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า และบ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ระยะเวลาดำเนินการ	9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2570)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 2 มกราคม 2562
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,000.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	1,252.36 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 1,032.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.44 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 59.38

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	100.00	59.38
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	32.68	32.68
ค่าที่ดิน	59.56	59.56
สำรวจออกแบบ และ EIMP	7.76	7.76

2.9 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน สำหรับช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และการอุปโภค - บริโภคในช่วงฤดูแล้งของราษฎรที่อยู่ในเขตอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 2. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 3. เพื่อช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตที่ได้รับประโยชน์จากโครงการให้ดีขึ้น 4. เพื่อเป็นแหล่งขยายเพาะพันธุ์ปลาหรือสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ ให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริม 5. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง 6. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เป้าหมาย	ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 40 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 30,000 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 5 เมษายน 2565 (อยู่ระหว่างเสนอ ครม. อนุมัติขยายวงเงินและระยะเวลา)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,561.62 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	663.77 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 663.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 80.60

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง	100.00	80.60
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	100.00	80.60

2.10 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค - บริโภค การประปา รักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง
เป้าหมาย	ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 295 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 113,300 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ	17 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2570)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 27 ตุลาคม 2552 (มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,078.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	139.73 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 127.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.08 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 96.77

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	100.00	96.77
เขื่อนเก็บกักและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	56.07	100.00
ระบบชลประทานฝั่งขวา	4.62	36.42 (ยกเลิกสัญญา)
ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1	18.47	97.21
ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2	8.97	62.52
ระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย	2.10	81.81
ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9.77	93.94

2.11 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม
เป้าหมาย	ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น 98 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 40,590 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาดำเนินการ	17 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2569)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 28 เมษายน 2552
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,341.36 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	100.69 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 36.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.69 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 95.46

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	100.00	95.46
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	38.30	100.00
คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา	17.01	95.69
คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย	12.96	100.00
คลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2	11.61	96.37
คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 1R-1L-RMC	0.84	100.00
คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ สาย 1L-LMC	3.69	
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	15.59	93.87

2.12 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มน้ำตอนบน 2. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค ของประชาชนตลอดจนสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ง 3. เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้านท้ายน้ำในฤดูฝน บริเวณอำเภอท่าวังผา ตลอดจนพื้นที่ราบลุ่ม ริมลำน้ำน่าน 4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ 5. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 6. เพื่อเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริม
เป้าหมาย	พัฒนาระบบชลประทาน 35,558 ไร่ (พื้นที่ชลประทานเดิม 19,558 ไร่ พื้นที่ชลประทานใหม่ 16,000 ไร่)
สถานที่ดำเนินการ	ครอบคลุม 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลผาทอง ตำบลผาตอ ตำบลป่าคา ตำบลแสนทอง ตำบลศรีภูมิ ตำบลริม ตำบลตาลชุม และเทศบาลตำบลท่าวังผา ครัวเรือนรับประโยชน์ 6,305 ครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2573)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 17 มกราคม 2566
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,200.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	151.77 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 151.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 4.32

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จังหวัดน่าน	100.00	4.32
ค่าที่ดิน	6.28	47.18
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	2.99	50.76
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (บูรณะสิ่งก่อสร้าง)	0.01	
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (บูรณะถนน)	0.04	
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ (เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น)	40.07	
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ (ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ)	47.59	
ค่าสำรวจออกแบบ	0.03	
ค่างบประมาณตามแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	2.99	0.86

2.13 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค - บริโภค ของราษฎรโดยเฉพาะเทศบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อกักเก็บน้ำหลากส่วนเกินในช่วงฤดูฝนไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกในช่วงเวลาฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง ใน 3 ตำบลของอำเภอหนองบัวแดง ได้แก่ ตำบลหนองแวง ตำบลหนองบัวแดง และตำบลนางแดด พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
เป้าหมาย	เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค - บริโภค เทศบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นปริมาณน้ำ 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 40,000 ไร่ (ข้าว 20,000 ไร่ อ้อย 20,000 ไร่) ฤดูแล้ง 28,000 ไร่ (ข้าว 8,000 ไร่ อ้อย 20,000 ไร่) คิดเป็นปริมาณน้ำ 105.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ คิดเป็นปริมาณน้ำ 73.27 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
สถานที่ดำเนินการ	ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2569)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	30 ตุลาคม 2561
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,100.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	356.70 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 243.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.38 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 88.66

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	100.00	88.66
ค่าที่ดิน	23.20	100.00
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	0.53	60.90
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	0.01	100.00
ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	74.24	85.93
ค่าสำรวจออกแบบ	0.48	85.97
ค่าใช้จ่ายตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	1.54	59.82

2.14 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน จำนวน 19.20 ล้าน ลบ.ม. 2. เพื่อช่วยเหลือพื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝนจำนวน 11,000 ไร่ และ ฤดูแล้งจำนวน 3,000 ไร่ 3. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 4. เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง
เป้าหมาย	ปริมาณน้ำต้นทุนความจุเก็บกัก 19.20 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 11,000 ไร่ ฤดูแล้ง 3,000 ไร่ สนับสนุนการอุปโภค - บริโภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม./ปี รักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ประมาณ 1.3 ล้าน ลบ.ม./ปี และมีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าตะเกียบ
ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2569)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,980.00 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	125.32 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 115.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.55 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 92.78

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา	100.00	92.78
งานทำนบดินหัวงานหลัก	83.53	94.52
งานอาคารระบายลงน้ำเดิมและอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา	4.82	100.00
งานอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย	1.63	100.00
งานอาคารระบายน้ำล้น	10.02	73.59

2.15 โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านเกษตรกรรม พื้นที่ 90,200 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานโครงการกิ่วลม - กิ่วคอหมา ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 2. เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม และประมงในเขตจังหวัดลำปาง และช่วยบรรเทาอุกทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน
เป้าหมาย	เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 47,200 ไร่
สถานที่ดำเนินการ	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ระยะเวลาดำเนินการ	22 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2569)
มติคณะรัฐมนตรีเปิดโครงการ	วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567)
วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,670.05 ล้านบาท
งบประมาณตามแผนปี 2568	42.00 ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย 9.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.48 ผลการดำเนินงานทั้งโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 92.31

สรุปผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานที่ทำ	% ของโครงการ	% ผลการดำเนินงาน (10 20 30 40 50 60 70 80 90 100)
โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง	100.00	92.31
งบบุคลากร	2.94	100.00
งบดำเนินการ	1.43	100.00
ค่าครุภัณฑ์	0.55	100.00
ค่าที่ดิน	18.44	100.00
ค่าสิ่งก่อสร้าง	65.41	100.00
ค่าสำรวจและดำเนินการระหว่างก่อสร้าง	0.62	100.00
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	6.46	100.00
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	0.09	100.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.72	100.00
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	57.52	100.00
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	22.34	100.00
ระบบชลประทานกิ่วลม III ระยะที่ 3	8.38	5.83
งบประมาณตามแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	8.57	100.00
